La gestion de projet

Cette fiche présente :

1) **La gestion de projet,**
2) **L'approche projet Vs approche produit,**
3) **Différentes méthodes de gestion de projet,**
4) **La conduite de projet ou de produits dans l'administration,**
5) **L'externalisation de prestations**
6) **Différents outils de gestion de projets.**

1. Introduction à la gestion de projets

1.1 La notion de projet

1) Définition

Projet : ensemble coordonné d'activités et d'actions entreprises dans le but de répondre à un besoin dans un délai déterminé en mobilisant des ressources qui lui sont allouées [1].

2) Cadrage du projet

Ces différentes activités doivent être réalisées dans des délais fixés, et mobilisent un ensemble de ressources (humaines, matérielles ou financières) afin de produire un ensemble de livrables ayant des caractéristiques attendues. Afin de produire de manière efficace les livrables attendus, dans les délais impartis, avec un ensemble de ressources il est nécessaire de mettre en place une gestion de projet.

1.2 La gestion de projet

1) Définition

Ensemble de techniques et de méthodes utilisées pour planifier, organiser, sécuriser et contrôler les ressources afin d'atteindre des objectifs spécifiques. Un projet est un effort temporaire entrepris pour créer un produit, un service ou un résultat unique.

2) Cas des projets informatiques

La gestion de projet revêt une importance particulière en raison de la nature complexe et souvent technique des projets informatiques. Ces derniers peuvent varier en taille et en complexité, allant du développement d'une simple application mobile à la mise en œuvre d'un système d'information d'entreprise à grande échelle.

3) Réussir la gestion de son projet

Sa réussite dépend en grande partie de la qualité de sa gestion. Une bonne gestion de projet permet de respecter les délais et le budget, tout en répondant aux attentes en matière de qualité et de fonctionnalités. Elle contribue également à minimiser les risques et à gérer efficacement les problèmes lorsqu'ils surviennent.

La complexité d'un projet est induite par la quantité d'interaction qu'il est nécessaire de coordonner.

1.3 Les différentes phases d'un projet

Le Project Management Body of Knowledge (PMBOK) [2] [3] divise le cycle de vie de gestion de projet en **cinq étapes** distinctes :

1) Lancement / Initialisation [4]

Avant de commencer un projet, il est important de déterminer si ce dernier vaut la peine d'être réalisé. Pour cela il est nécessaire de le définir dans les grandes lignes afin de démontrer sa valeur (au-delà d'un simple retour sur investissement, celle-ci peut être réglementaire, apporter des gains pour les agents…). Cette phase doit aussi permettre d'obtenir l'approbation de toutes les parties prenantes afin de garantir l'obtention des différentes ressources (financières, techniques et humaines). On parle aussi d'étude de cadrage. À l'issue de cette phase, le projet est officiellement lancé avec la nomination d'un chef de projet.

2) Planification

Cette phase va permettre de préciser les éléments clés du projet : les objectifs, le périmètre, les exigences, les contraintes, les délais, le budget, les tâches à accomplir, le rôle et les responsabilités de chacun, la gestion des risques et la communication. Une partie de ces informations a été définie de manière macroscopique lors de la phase de lancement, toutefois, cette dernière ne permet pas de statuer suffisamment finement pour définir tous les éléments clefs du projet.

3) Exécution

Il s'agit du moment où l'équipe réalise les différentes tâches nécessaires visant à obtenir les livrables projets (comme le code, la documentation, la définition de l'architecture…). Pour le chef de projet, cette phase consiste principalement à déléguer les différentes tâches aux membres constituant l'équipe projet et à s'assurer que ces dernières sont faites dans les temps et le budget alloué.

4) Monitoring / Suivi et contrôle

Cette phase se déroule en parallèle de la phase d'exécution et consiste à surveiller le temps, les coûts, la qualité et les risques associés au projet afin de s'assurer que le projet se déroule conformément aux attentes. Le chef de projet se basera alors sur des indicateurs de performance afin de détecter au plus tôt les dérives et prendre les mesures nécessaires.

5) Clôture

Cette phase correspond au bilan : satisfaction client, dépassement éventuel du budget ou du temps imparti. C'est l'occasion de faire un retour d'expérience et de déterminer ce qui a bien fonctionné et ce qui demande à être amélioré pour être plus performant lors des prochains projets.

1.4 Le rôle du chef de projet

Le chef de projet est avant tout le chef d'orchestre qui doit mettre en musique toutes les interactions entre les différentes parties prenantes durant l'ensemble des phases projet. Pour cela il va devoir échanger avec l'ensemble des participants, s'assurer de la réalisation des fonctionnalités produit, attribuer les tâches selon le rôle et les compétences de chaque membre de l'équipe, s'assurer de la progression du projet dans le respect des coûts et des délais ou animer les différentes réunions avec les parties prenantes [5].

Un projet est loin d'être un long fleuve tranquille [5]. Aussi le chef de projet sera confronté durant la vie de son projet à de nombreux aléas qu'il va devoir traiter. Parmi les plus courants, on va identifier :

1) Les dérives en temps et en budget

Aléas qui peuvent nécessiter de renégocier des re-planification, des rallonges budgétaires ou des suppressions de fonctionnalités ;

2) Les dérives d'objectifs

Les objectifs initiaux sont peu à peu éclipsés par de nouvelles demandes. Cela se traduit par des réajustements en continu sur les différentes composantes du projet en jouant par exemple sur la priorité. Si ces derniers sont trop nombreux, le projet peut très vite aller vers des dérives en temps et en budget ;

3) Des difficultés dans la gestion de la communication comme des incompréhensions entre les parties prenantes

Toute la difficulté pour le chef de projet consiste à adapter son discours aux profils et à la position hiérarchique de chaque intervenant et à vérifier que la teneur de ces propos est correctement prise en compte ;

4) La gestion d'événements plus ou moins prédictibles

Pour pallier ce type de problème, il est important de mettre en place une gestion des risques et pour chacun d'entre eux prévoir une solution de secours plus ou moins détaillée. Le suivi de ces risques doit permettre de réévaluer périodiquement les probabilités associées et d'affiner les solutions alternatives au fur et à mesure que ce dernier se précise ;

5) Les problèmes techniques ou les évolutions technologiques

Ils peuvent remettre en cause tout un pan du projet. Dans un contexte où la technologie occupe une part importante, il est fort probable qu'à un moment du projet, on constate que les solutions initialement envisagées ne permettent pas d'aboutir au résultat attendu. Le chef de projet doit veiller à ce que son projet garde une certaine souplesse afin de lui permettre de faire évoluer une partie du projet sans pour autant impacter l'ensemble de ce dernier.

2. Approche projet vs approche produit

2.1 Introduction à la notion de produit

La production d'applications informatiques a pendant très longtemps été gérée en utilisant une approche de gestion de projet, avec des processus similaires à ceux mentionnés dans la section « 1 L'apparition des méthodes agiles dans les années 90 a fait émerger la notion de produit. Même si les deux approches visent à concevoir un logiciel, le cheminement permettant d'arriver à l'application est très différent.

2.2 Principales différentes entre une approche projet et une approche produit

La gestion de produits et la gestion de projets se différencient principalement par les points suivants [6] :

1) Caractéristiques

Les cycles projet se caractérisent par une durée précise (une date de début et une date de fin) alors qu'une **gestion de produit** consiste à adapter continuellement un produit aux exigences du client sans limite de temps fixée à l'avance ;

2) Objectif

Un chef de projet va se focaliser sur l'avancement du projet en coordonnant son équipe, **un chef de produit** va interagir de manière plus importante avec des parties prenantes externes à travers des recherches d'information (satisfaction client, les améliorations à prendre en compte dans une nouvelle version ...) ;

3) Méthode

Un chef de projet va mettre en avant des compétences en lien avec la planification, l'organisation, la gestion des risques et la communication. **Un chef de produit** va orienter ces compétences vers la bonne compréhension du marché, la réflexion stratégique, l'analyse de données pour prendre en compte les différents retours ;

4) Planification

Le chef de projet va surtout se focaliser sur le **respect des délais**, la gestion de marge de manœuvre dans les plannings afin de faire face aux imprévus alors que **le chef de produit** va plutôt se focaliser sur une feuille de route et **comment faire évoluer son produit** dans le temps ;

5) Indicateurs de réussite

Pour un chef de projet, les indicateurs de **réussite** correspondent à l'**atteinte des objectifs** primaires et secondaires **dans le temps imparti** avec les ressources initialement provisionnées. **Pour un chef de produit**, les critères de réussite s'articulent autour de la **satisfaction du client**, de la part de marché et des bénéfices.

La gestion de projet, la gestion de produit, ce sont donc bien deux manières différentes d'adresser nos défis quotidiens. Dans le fond, les deux approches vont régulièrement cohabiter. Lorsqu'on se lance sur une itération, on a finalement tendance à réaliser un « micro projet ». Alors, certes, on n'utilise pas la panoplie complète, mais on retrouvera tout de même quelques attributs, hérités de la gestion de projet (que ce soit pour l'estimation des coûts, le planning prévisionnel).

2.3 Cahier des charges vs Backlog [7]

1) Ce qu'il faut réaliser

Entre projet et produit, on retrouve deux approches différentes pour définir les caractéristiques de ce qu'il faut réaliser. : le cahier des charges d'un côté et le backlog de l'autre. Le cahier des charges et le backlog poursuivent tous deux l'objectif de définir un produit final qui soit le plus proche des besoins effectifs de l'utilisateur. Toutefois, pour y arriver l'approche est très différente.

2) En mode projet : le cahier des charges

En mode projet, les équipes imaginent le produit sur la base d'un cahier des charges. C'est un document statique qui va servir de référence tout au long du projet afin de vérifier que les livrables correspondent bien aux fonctionnalités demandées par le client. Le cahier des charges va ainsi définir un ensemble d'exigences fonctionnelles et des critères de performances associés. Il s'agit d'un document formel et statique qui est accepté pendant la phase de planification. Toute modification passe par un processus de validation formel et donc peu flexible.

3) En mode produit : le Backlog

Le backlog correspond à une liste de tâches en attente de traitement. Ce dernier est constamment mis à jour afin de refléter les besoins des clients qui peuvent évoluer au fur et à mesure que ceux-ci découvrent le produit. Les informations présentes dans le backlog sont structurées sous la forme de « user stories » qui vont représenter les fonctionnalités attendues, des changements de priorité ou des correctifs à apporter aux livrables. Il s'agit d'un document vivant continuellement mis à jour.

4) Résumé

Le cahier des charges est un document statique qui spécifie les exigences d'un livrable, tandis que le backlog produit est une liste dynamique et évolutive représentant les tâches à réaliser dans le cadre d'un processus de développement agile. Dans les deux cas, c'est le document qui permet de cadrer le développement du livrable, assurant ainsi que sa forme finale réponde parfaitement aux besoins du client.

2.4 En synthèse

La notion de projet est associée à la réalisation d'un ensemble de tâches fixé dès le début du projet. Les ressources et le temps à allouer au projet dépend directement du périmètre initial. Ces deux éléments vont donc faire office de variable d'ajustement.

L'approche produit va permettre de dégager de la valeur à partir d'un ensemble de ressources et de temps à consacrer au produit. Ici c'est la valeur, c'est-à-dire le nombre de fonctionnalité qui va faire l'objet de variable d'ajustement.

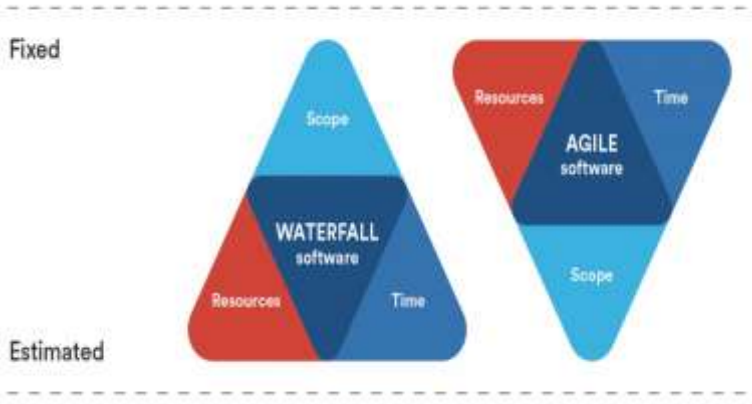

Figure 1 : Iron triangle [8]

3. Méthodologies de gestion de projet

Le recours au mode projet n'est pas propre au domaine informatique, toutefois il est omniprésent sur la plupart des activités d'une DSI. De par cette importance, de nombreuses méthodologies dédiées au domaine informatique existent.

3.1 Principales méthodologies projet

Les méthodologies projets sont nombreuses, les plus couramment utilisées peuvent être partitionnées en deux catégories :

1) Méthodes traditionnelles : Ces méthodes, comme la méthode en cascade (ou Waterfall), Prince2 et le chemin critique, suivent une approche séquentielle où chaque phase du projet doit être terminée avant de passer à la suivante.

2) Méthodes Agiles : Ces méthodes, comme Scrum, Kanban et Extreme Programming, sont plus flexibles et permettent des modifications tout au long du projet. Elles favorisent la collaboration et l'adaptabilité.

Même si certaines méthodologies sont plus populaires que d'autres, il n'est pas possible d'affirmer qu'une est meilleure qu'une autre sans se référer au contexte. En effet, le choix se fait avant tout en fonction des caractéristiques du projet.

Sans être exhaustif voici **quelques facteurs à prendre en compte** [9] :

1) La taille du projet : pour un projet petit on favorisera des méthodologies légères comme « Kanban » [10] qui offre beaucoup de flexibilité alors que pour un gros projet on privilégia une méthode plus structurée comme « Prince2 » [11] qui permet au contraire d'apporter une très forte structuration.

2) La taille de l'équipe projet : plus le nombre d'intervenant est important, plus la communication sera complexe. Par exemple, les méthodologies agiles recommandent des équipes de 7 à 10 personnes (pizza team).

Des méthodologies comme « Kanban », « Scrum » [12] ou « Lean » [13] sont tout à fait adaptées. Pour un passage à l'échelle, il faudra se tourner vers des méthodologies plus spécifiques comme « SAFe » [14] ou encore « Scrum of Scrum ».

3) Le niveau de complexité : plus un projet est complexe, plus il comporte des risques et plus le pilotage doit être fin. On privilégiera des méthodologies qui décrivent finement toutes les étapes.

4) Le degré d'incertitude / objectifs qui ne sont pas clairement définis : un projet ayant un haut degré d'incertitude verra probablement son périmètre évoluer au cours du temps. Dans ce cas de figure, on privilégiera des méthodes agiles qui permettent de mettre en œuvre des cycles courts et augmenter le rythme des retours de la part du client / MOA.

5) Le niveau de maturité des équipes sur l'organisation projet : pour des équipes ayant peu d'expérience, on se dirigera vers les méthodes les plus simples.

Dans l'administration, les projets ont longtemps été pilotés par des méthodes traditionnelles en phase avec un cahier des charges peu évolutifs souvent régis pas des aspects législatifs. Toutefois, le besoin grandissant d'interaction entre les projets eux-mêmes ainsi que la nécessité de devoir s'adapter continuellement aux besoins des usagers conduisent à une utilisation grandissante des méthodologies agiles.

Dans les faits, une entreprise ne se limite que très rarement à une déclinaison stricte d'une méthode. En effet, on est souvent confronté à des approches hybrides qui mélangent à la fois les méthodes traditionnelles et les méthodes agiles.

3.2 Focus sur une méthodologie traditionnelle : Modèle en cascade

Le modèle en cascade [15] est une méthodologie relativement ancienne (présentée pour la première fois en 1956) qui a largement été adoptée et déclinée. Cette méthode est souvent utilisée dans les projets où la réalisation de chaque étape dépend de l'étape précédente. Le projet est divisé en plusieurs étapes ordonnées de manière linéaire, et chaque tâche doit être terminée avant d'entamer la suivante. On peut rattacher à cette méthode le « cycle en V » qui est une amélioration de l'approche cascade qui consiste à mettre en face de chaque phase une étape de validation.

Les étapes typiques du modèle en cascade [16] comprennent :

1) Une phase d'analyse centrée sur l'identification des besoins du client

2) Une phase de conception permettant de concevoir les livrables. Cette phase peut être décomposée en conception générale et conception détaillée

3) Une phase d'implémentation qui vise à produire les livrables au sens large (code, documentation, dossiers d'architecture, document d'exploitation...)

4) Une phase de tests qui permet de s'assurer que ce qui est produit est conforme aux exigences

5) Une phase de maintenance destinée à faire évoluer l'application à la marge et maintenir l'application en condition opérationnelle et de sécurité.

Bien que cette méthode soit rigide et ne permette pas beaucoup de flexibilité, elle offre une structure claire et est particulièrement utile pour les projets avec des objectifs bien définis et peu susceptibles de changer.

3.3 Focus sur une méthodologie agile : Scrum

Parmi toutes les méthodes agiles, Scrum est sans doute l'une des plus populaires. Elle offre un cadre de travail qui facilite la collaboration au sein des équipes et les aide à réaliser des tâches à haute valeur ajoutée [17]. Sans être exhaustif, la méthodologie Scrum se caractérise à travers les éléments suivants :

1) Le travail est réparti au sein de sprints : un sprint est une période de temps fixée au début du projet qui permet à une équipe de réaliser une quantité de travail donnée. Généralement les sprints ont une durée de deux semaines. Cette approche itérative permet de délivrer plus fréquemment du code fonctionnel. Chaque fin de sprint est ainsi l'occasion pour les équipes d'échanger, de revenir sur les difficultés, les non conformités et de conforter les points positifs. À travers cette démarche le client / MOA peut tester et évaluer ce qui a été fait et revenir sur certains points des spécifications.

2) Le travail de l'équipe est organisé autour de rituels appelé cérémonies. Sans être exhaustif, on retiendra :

a) L'organisation du back log qui consiste pour le responsable produit à prioriser les tâches contenues dans le back log et s'assurant que ces dernières sont en ligne avec les attentes du client ;

b) La planification du sprint où l'ensemble de l'équipe de développement détermine l'objectif du sprint et les « user stories » à ajouter au sprint ;

c) Le stand-up qui est une mini-réunion quotidienne d'une quinzaine de minutes afin de mettre tous les membres de l'équipe en phase avec l'objectif du sprint et de définir un plan pour les 24 prochaines heures ;

d) La revue de sprint qui rassemble toute l'équipe afin de réaliser une démonstration des travaux réalisés et de recueillir les retours sur ce qui a été fait. C'est typiquement le moment qui va permettre au métier de corriger les orientations prises (fonctionnalités, interface homme-machine…) ou à l'équipe de développement de mettre en avant des problèmes ou des incohérences dans les « user stories » ;

e) La rétrospective de sprint qui est l'occasion de documenter ce qui a fonctionné ou non afin de mettre en œuvre une démarche d'amélioration continue.

Le mode de travail adopté dans une méthodologie agile implique de revenir régulièrement sur des fonctionnalités déjà développées, soit pour les compléter, soit pour prendre en compte les évolutions demandées par le responsable produit. Afin d'assurer une continuité dans la qualité des livrables, il est souhaitable de mettre en place une chaîne d'intégration continue qui va notamment permettre à travers l'exécution automatique des tests unitaires et de tests métier de détecter au plus tôt les régressions que les nouveaux développements auraient pu apporter. Ce type de bonne pratique n'est pas spécifique aux méthodes agiles, toutefois elles prennent une place plus importante notamment en raison des livraisons très régulières induites par la méthode.

4. La conduite de projet ou de produit dans l'administration

Les points suivants ont pour objectif de se focaliser sur certains aspects que l'on retrouve notamment au sein des directions des systèmes d'informations des administrations et qui ne sont pas nécessairement directement développés dans les différentes méthodes de conduite de projets.

4.1 Prise en compte des ressources transverses

La conduite de projet nécessite généralement des ressources qui ne sont pas directement affectées à l'équipe projet. Ces dernières comprennent par exemple du matériel comme une plateforme de test ou des équipes spécialisées dans un domaine particulier comme les normes, l'architecture, des équipes en charge des tests.

La gestion de ce type de ressources nécessite une attention toute particulière car le chef de projet ne maîtrise pas leur calendrier et ce dernier peut évoluer au cours du temps sous l'impulsion d'événements externes. Ces ressources sont généralement nécessaires sur des phases spécifiques du projet : définition et validation de l'architecture, mise en place de l'infrastructure ou encore la phase de tests.

Pour ce type de ressource, le chef de projet veillera notamment à :

1) Communiquer en avance de phase son calendrier aux équipes transverses afin que ces dernières puissent inclure les besoins projet dans leur propre calendrier ;

2) Communiquer les changements de calendrier ou de périmètre qui pourraient impacter les équipes transverses ;

3) Ne pas hésiter à vérifier la disponibilité des ressources transverses en avance de phase afin de pouvoir aménager le calendrier projet en conséquence ou de demander les arbitrages nécessaires suffisamment tôt.

4.2 Les comités / la comitologie

Dans la gestion de projet, il est essentiel de réaliser un suivi à plusieurs niveaux pour assurer le bon déroulement et la réussite du projet. Ce suivi permet de contrôler l'avancement du projet, d'identifier les éventuels écarts par rapport au plan initial et de prendre les décisions appropriées pour rectifier le tir. Les décisions peuvent concerner la réaffectation des ressources, la modification des échéances, ou même la redéfinition des objectifs du projet.

La gouvernance du projet est donc assurée par différents types de comité :

1) Le comité de suivi de projet est généralement composé des membres de l'équipe de projet et se concentre sur le suivi quotidien du projet, y compris la résolution des problèmes et la coordination des tâches ;

2) Le comité de pilotage a pour mission de superviser le projet, de prendre des décisions stratégiques et de résoudre les problèmes majeurs. Il est composé de parties prenantes clés (généralement au niveau responsable de bureau / département) ;

3) Le comité stratégique est généralement composé de hauts dirigeants (niveau direction) de l'organisation et a pour rôle de définir la direction stratégique du projet et de s'assurer qu'il est aligné sur les objectifs globaux de l'organisation.

Chacun de ces comités joue un rôle unique et indispensable pour assurer le succès du projet.

4.3 Prise en compte des différents référentiels

L'administration est soumise au respect de différents référentiels et règlements. Tout au long du projet, il faut veillerà ce que les livrables soient conformes à ces derniers.

1) Règlement général sur la protection des données (RGPD) [18] : l'objectif du RGPD est de permettre aux citoyens européens de vérifier et faire valoir leurs droits sur leurs données personnelles : Droit à l'information : droit de savoir comment sont collectées les données et dans quel but. Droit d'accès : droit de savoir quelles données les entreprises collectent sur un individu ;
2) Référentiel général de sécurité (RGS) [19]: le RGS fixe, selon le niveau de sécurité requis, les règles que doivent respecter certaines fonctions contribuant à la sécurité des informations, parmi lesquelles la signature électronique, l'authentification, la confidentialité ou encore l'horodatage ;
3) Référentiel général d'interopérabilité (RGI) [20] : le RGI est un cadre de recommandations référençant des normes et standards qui favorisent l'interopérabilité au sein des systèmes d'information de l'administration ;
4) Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) [21] : l'accessibilité numérique permet aux personnes souffrant de handicap d'accéder facilement aux services disponibles en ligne. Le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, impose des pratiques permettant de garantir l'accessibilité web.
5) Référentiel général d'écoconception de services numériques (RGESN) [22] : les objectifs du RGESN sont de réduire la consommation de ressources informatiques et énergétiques et la contribution à l'obsolescence des équipements, qu'il s'agisse des équipements utilisateurs ou des équipements réseau ou serveur.

5. Prestations externes et gestion de marché

Dans l'administration, les projets sont rarement réalisés entièrement en interne. En effet, pour faire face à une charge ponctuelle ou pour disposer de compétences particulières, un projet fait souvent appel à de la prestation externe. Le recours à ce type de prestation doit suivre des règles de la commande publique qui peut amener des contraintes fortes sur le projet (contrainte budgétaire, calendaire, …) qu'il faut anticiper.

5.1 Principe de la commande publique

La commande publique est un ensemble de règles qui régissent l'attribution et l'application des contrats publics. Les principes fondamentaux de la commande publique sont [23][24] :

1) Liberté d'accès à la commande publique :

Ce principe garantit que tout opérateur économique a le droit de participer à un marché public, quel que soit sa taille ou son secteur d'activité ;

2) Égalité de traitement des candidats :

Tous les candidats à un marché public doivent être traités de la même manière. Cela signifie que les critères de sélection doivent être appliqués de manière uniforme à tous les candidats ;

3) Transparence des procédures :

Les procédures de passation des marchés publics doivent être transparentes. Cela signifie que les critères de sélection, les règles de procédure et les décisions prises doivent être clairement expliqués et justifiés.

Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Il résulte de ces principes les règles suivantes (de manière simplifiée) :

1) Pour les achats inférieurs à 40 k€, le code de la commande publique n'oblige à aucune procédure particulière. Toutefois, afin de garantir le principe de bonne utilisation des deniers publics, les services financiers des directions peuvent imposer des règles comme la présentation systématique de plusieurs devis ;

2) Pour les achats supérieurs à 40 k€, il est nécessaire de réaliser une mise en concurrence à travers la passation d'un marché public.

5.2 Les différents vecteurs d'achat

1) Support d'achat interministériel

Les différents marchés sont souvent mutualisés au niveau de la Direction des Achats de l'État (DAE). Dans ce cas, il devient possible de profiter d'un marché passé par un autre ministère si l'objet de ce dernier couvre le produit ou la prestation recherchée.

2) Recours à un groupement d'achats publics

L'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) est une centrale d'achat public qui offre une grande variété de services et de produits. Le recours à la centrale d'achat, dispense ses clients de toute mise en concurrence et publicité préalables. Le recours à l'UGAP implique de devoir régler un markup correspondant à un pourcentage de la commande.

3) Passation d'un marché

La réalisation d'un marché dure entre 6 mois et 1 an. Cette procédure se déroule en plusieurs phases : identification des besoins (on fera par exemple référence aux différents référentiels à suivre), rédaction du marché (clauses administratives CCAP, clauses techniques CCTP, grille de notation…), publications, dépouillement qui comprend éventuellement une phase de question réponses, lancement du marché.

4) Définition du besoin : unités d'œuvre

Dans le domaine informatique, les équipes ont souvent recours à des marchés à unités d'œuvres. Ce type de marché permet de définir un ensemble d'unités d'œuvres dont le prix est décliné selon la complexité de cette dernière.

Chaque unité d'œuvre décrit une typologie de services et les conditions dans lesquelles le service est rendu. Par exemple, dans un marché informatique de développement, on trouvera une unité d'œuvre liée au développement de fonctionnalités, de pilotage, ou encore d'expertise…

5.3 Commande d'une prestation

Concrètement, devoir recourir à une prestation externe ou un achat (matériel ou licences) nécessite d'anticiper tous les engagements budgétaires à réaliser afin de pouvoir suivre les procédures d'achat :

1) Demande d'un devis : il doit être signé par la hiérarchie en accord avec son niveau de délégation budgétaire. S'il s'agit de prestations intellectuelles, des règles complémentaires peuvent s'appliquer (selon les directions) ;

2) Intégration du devis dans Chorus et suivi du Workflow ;

3) Émission du bon de commande (une prestation ne peut pas débuter sans bon de commande).

Dans le cadre de certaines prestations comme le recours à un expert dans un domaine donné, il est souvent nécessaire d'auditionner différents profils proposés par le détenteur du marché. La démarche est similaire à un entretien d'embauche comme on pourrait le faire dans le cadre du recrutement d'un contractuel.

6. Divers outils à connaître

Afin de l'aider dans ces tâches quotidiennes, le chef de projet peut s'appuyer sur différents outils. Sans être exhaustif cette section liste les plus courant.

1) Le RACI (responsible, accountable, consulted et informed) [25] est une matrice qui met en évidence le rôle et les responsabilités des différents acteur d'un projet. L'établissement et la validation d'un RACI est vivement encouragé au début du projet afin de s'assurer que toutes les parties prenantes sont en phase avec les attentes définies en début de projet ;

2) Le diagramme de Gantt [26] est très couramment utilisé dans la gestion de projet afin de présenter la durée, les dépendances, l'enchaînement des tâches, les jalons et les responsables de chaque tâche dans un formalisme visuel.

3) Le tableau Kanban [27][28] est un système qui permet de visualiser les différentes tâches sous la forme de cartes que l'on dispose dans les colonnes d'un tableau représentant une activité spécifique. Ces activités correspondent généralement à une étape du workflow associé à une tâche (par exemple : à faire, en cours de traitement, en cours de recette, livrée ...)

4) Les logiciels de gestion de projet aident les équipes à organiser, suivre et exécuter leurs tâches. Ils peuvent aller d'une simple liste de contrôle numérique à une plateforme de gestion du travail complexe et complète. Le choix du logiciel dépendra de la taille, des besoins et des objectifs globaux de l'entreprise.

Bibliographie / sources :

Gestion de projet :

1 : Gestion de projet - https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_projet
2 : The PMBOK's Five Project Phases - https://www.projectengineer.net/the-pmboks-five-project-phases/
3 : PMBOK : Définition & Guide d'Introduction pour les Débutants - https://www.wimi-teamwork.com/fr/blog/pmbok-guide-dintroduction-debutant/
4 : Le démarrage du projet : la première étape d'une gestion de projet efficace - https://asana.com/fr/resources/project-initiation

Gestion de projet / de produit :

5 : Gestion de projet informatique : un guide pour les managers et leurs équipes - https://asana.com/fr/resources/it-project-management
6 : Gestion de produit vs. gestion de projet : 5 principales différences - https://www.bitrix24.fr/articles/gestion-de-produit-vs-gestion-de-projet-5-principales-differences.php
7 : Quelle est la différence entre cahier des charges et backlog produit ? - https://prefix.ch/quelle-est-la-difference-entre-cahier-des-charges-et-backlog-produit/
8 : Projet VS produit - https://blog.myagilepartner.fr/index.php/2019/06/27/projet-vs-produit/
9 : 15 critères à évaluer pour choisir la bonne méthodologie de gestion de projets - https://www.reussirsesprojets.com/choisir-methode-gestion-projet/
10 : Gestion de projet : comment utiliser la méthode Kanban ? - https://www.codeur.com/blog/gestion-de-projet-methode-kanban/

Méthodologie de projet :

11 : PRINCE2 - https://fr.wikipedia.org/wiki/PRINCE2
12 : Scrum - https://fr.wikipedia.org/wiki/Scrum_(développement)
13 : - https://fr.wikipedia.org/wiki/Lean_(production)
14 : Scaled agile framework - https://fr.wikipedia.org/wiki/Scaled_agile_framework
15 : Modèle en cascade (Waterfall) : Définition et étapes de gestion de projet - https://blog-gestion-de-projet.com/modele-en-cascade/
16 : Méthode en cascade ou Waterfall - https://geniorama.com/methodes-gestion-projet-comment-choisir/
17 : Qu'est-ce que Scrum et comment se lancer - https://www.atlassian.com/fr/agile/scrum

Référentiels à connaître :

18 : Le règlement général sur la protection des données - RGPD - https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
19 : Référentiel général de sécurité - https://fr.wikipedia.org/wiki/Référentiel_général_de_sécurité
20 : Référentiel général d'interopérabilité (RGI) - https://www.numerique.gouv.fr/publications/interoperabilite/
21 : Rendre les sites et services numériques accessibles à toutes et à tous - https://accessibilite.numerique.gouv.fr/
22 : https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/ - https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/

Commande publique :

23 : Qu'est-ce qu'un marché public ? - https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F33466
24 : Commande publique - https://www.vie-publique.fr/ressources/mots-cles/commande-publique

Outils de gestion de projets :

25 : RACI - https://fr.wikipedia.org/wiki/RACI
26 : Comment créer un diagramme de Gantt : guide étape par étape - https://asana.com/fr/resources/gantt-chart-basics
27 : Kanban (développement) - https://fr.wikipedia.org/wiki/Kanban_(développement)
28 : Qu'est-ce qu'un tableau Kanban ? - https://www.atlassian.com/fr/agile/kanban/boards
